

---

H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA.



***SRFT***  
***3° INFORME***  
***TRIMESTRAL***  
***2023***

---

DEPENDENCIA	MPIO. PANTEPEC
SECCIÓN	PRESIDENCIA MPAL.
EXPEDIENTE	OBRAS-01/2023
NÚMERO DE OFICIO	PANT-2023/025

Pantepec, Puebla. 09 de noviembre de 2023

Asunto: **Validación tercer trimestre 2023**


**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente



C. Porfirio Castro Mateos  
Presidente Municipal

E. Mail: PORFIRIO\_CASTRO2018@hotmail.com  
Tel: 221 578 2647



C.c.p. Archivo Obras Públicas.

PLAZA PRINCIPAL S/N, COL. CENTRO, PANTEPEC, PUEBLA. C.P. 73020





MUNICIPIO DE PANITEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FRSM)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	3	0.00	0	3	0	0	3	META ALCANZADA AUN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"
	2do. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	25	0	0	25	META ALCANZADA AUN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"
	3er. Trimestre	2.94	1	34	0.00	0	42	0	0	42	META ALCANZADA AUN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"
	4to. Trimestre	1.54	1	65							
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMAS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACION
	2do. Trimestre	75.00	15	20	100.00	25	25	100.00	25	25	VARIACION A LA ALTA DEBIDO A CAMBIOS DE INCIDENCIA EN EL CATALOGO 2023 DE LOS LINEAMIENTOS FAIS
	3er. Trimestre	67.65	23	34	88.10	37	42	88.10	37	42	VARIACION A LA ALTA DEBIDO A CAMBIOS DE INCIDENCIA EN EL CATALOGO 2023 DE LOS LINEAMIENTOS FAIS
	4to. Trimestre	67.69	44	65							
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	3	0.00	0	3	0.00	0	3	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMAS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACION
	2do. Trimestre	25.00	5	20	0.00	0	25	0.00	0	25	AUN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION
	3er. Trimestre	29.41	10	34	11.90	5	42	11.90	5	42	VARIACION A LA BAJA DEBIDO A CAMBIOS DE INCIDENCIA EN EL CATALOGO 2023 DE LOS LINEAMIENTOS FAIS
	4to. Trimestre	30.77	20	65							

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 10 de Noviembre de 2023  
 RECIBIDO  
 FAI2/SB/CG/PS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	2741347.16	16448083	16.67	2741347.16	16448083	16.67	2741347.16	16448083	RECURSO MINISTRADO EN TIEMPO Y FORMA	
	2do. Trimestre	41.67	6853367.9	16448083	41.67	6853367.9	16448083	41.67	6853367.9	16448083	RECURSO MINISTRADO EN TIEMPO Y FORMA	
	3er. Trimestre	66.67	10965388.64	16448083	66.67	10965388.64	16448083	66.67	10965388.64	16448083	RECURSO MINISTRADO EN TIEMPO Y FORMA	
	4to. Trimestre	100.00	16448083	16448083								
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	16448083	16448083								
	Índice de Dependencia Financiera											
	Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	13.45	2212564.99	16448083	13.45	2212564.99	16448083	13.45	2212564.99	16448083	AVANCE MINIMO, DEBIDO A QUE EL RECURSO SE ENCUENTRA EN ASIGNACION.
2do. Trimestre		41.67	6853367.9	16448083	28.20	4637633.86	16448083	28.20	4637633.86	16448083	EL AVANCE ES MENOR AL PROGRAMADO DEBIDO A QUE HAY PROYECTOS EN VALIDACION	
3er. Trimestre		66.67	10965388.64	16448083	51.59	8485666.97	16448083	51.59	8485666.97	16448083	EL AVANCE ES MENOR AL PROGRAMADO DEBIDO A QUE HAY PROYECTOS EN VALIDACION	
4to. Trimestre		100.00	16448083	16448083								
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.23	6853367.9	1618494.50	4.65	6853367.9	1475160.50	4.65	6853367.9	1475160.50	SE REDUJO LA RECALCULACION EN CUANTO A LO PLANEADO, DEBIDO QUE SE HAN APLICADO DESCUENTOS A ALGUNOS SERVICIOS Y TRAMITES DEL MUNICIPIO.	
	4to. Trimestre	7.71	16448083	2,134,058.00								
	Índice de Variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
	Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	4to. Trimestre	92.23	2,134,058.00	1110183	-100.00			-100.00				

2do. Trimestre  
 4to. Trimestre  
 SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación

9 NOV 2023

RECIBIDO

POLIO SISTEMA SHCP		FASOMUR										OBSERVACIONES			
No. WWS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
PUE23020230048	118792	CONSTRUCCIÓN DE 68 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AMELUCA - 118792	AMELUCA	\$343,247.00	\$343,247.00	\$343,247.00	\$343,247.00	\$50,477.43	\$50,477.43	\$50,477.43	14.71%	14.71%	10 PREZAS	14.71%	OBRA EN PROCESO SE CUENTA CON UN AVANCE DE 10 PIEZAS DE 68
PUE23020230030	118718	CONSTRUCCIÓN DE 29 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL POZO - 118718	EL POZO	\$146,384.75	\$146,384.75	\$146,384.75	\$146,384.75	\$50,477.43	\$50,477.43	\$50,477.43	34.48%	34.48%	10 PREZAS	34.48%	OBRA EN PROCESO SE CUENTA CON UN AVANCE DE 10 PIEZAS DE 29
PUE23020230069	118876	CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 118876	IGNACIO ZARAGOZA	\$161,528.00	\$161,528.00	\$161,528.00	\$161,528.00	\$70,668.43	\$70,668.43	\$70,668.43	43.75%	43.75%	14 PREZAS	43.75%	OBRA EN PROCESO SE CUENTA CON UN AVANCE DE 14 PIEZAS DE 32
PUE23020229971	118505	CONSTRUCCIÓN DE 20 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EIDO CAÑADA COLOTLA - 118505	EIDO CAÑADA COLOTLA	\$100,955.00	\$100,955.00	\$100,955.00	\$100,955.00	\$75,716.25	\$75,716.25	\$75,716.25	75.00%	75.00%	15 PREZAS	75.00%	OBRA EN PROCESO SE CUENTA CON UN AVANCE DE 15 PIEZAS DE 20
PUE23030262793	239112	CONSTRUCCIÓN DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AGUA LINDA - 239112	AGUA LINDA	\$60,162.41	\$60,162.41	\$60,162.41	\$60,162.41	\$60,162.41	\$60,162.41	\$60,162.41	100%	100%	11 PREZAS	100%	OBRA COMPLETA
PUE23030262808	239187	CONSTRUCCIÓN DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CERRO VERDE - 239187	CERRO VERDE	\$27,346.55	\$27,346.55	\$27,346.55	\$27,346.55	\$27,346.55	\$27,346.55	\$27,346.55	100%	100%	5 PREZAS	100%	OBRA COMPLETA
PUE23030262465	237733	CONSTRUCCIÓN DE 10 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE BARRIO CHICO - 237733	BARRIO CHICO	\$54,693.10	\$54,693.10	\$54,693.10	\$54,693.10	\$54,693.10	\$54,693.10	\$54,693.10	100%	100%	10 PREZAS	100%	OBRA COMPLETA
PUE23030262522	237940	CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 237940	SANTA CRUZ	\$76,570.34	\$76,570.34	\$76,570.34	\$76,570.34	\$76,570.34	\$76,570.34	\$76,570.34	100%	100%	14 PREZAS	100%	OBRA COMPLETA
PUE23030262173	236155	CONSTRUCCIÓN DE 117 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE PANITEPEC - 236155	PANITEPEC	\$639,909.12	\$639,909.12	\$639,909.12	\$639,909.12	\$639,909.12	\$639,909.12	\$639,909.12	100%	100%	117 PREZAS	100%	OBRA COMPLETA
PUE23030262563	238141	CONSTRUCCIÓN DE 9 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL COYOL - 238141	EL COYOL	\$49,223.79	\$49,223.79	\$49,223.79	\$49,223.79	\$49,223.79	\$49,223.79	\$49,223.79	100%	100%	9 PREZAS	100%	OBRA COMPLETA
PUE23030262364	237081	CONSTRUCCIÓN DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE GUADALUPE - 237081	GUADALUPE	\$65,631.72	\$65,631.72	\$65,631.72	\$65,631.72	\$65,631.72	\$65,631.72	\$65,631.72	100%	100%	12 PREZAS	100%	OBRA COMPLETA
PUE23030262769	239034	CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL LIMONAR - 239034	LIMONAR	\$76,570.34	\$76,570.34	\$76,570.34	\$76,570.34	\$76,570.34	\$76,570.34	\$76,570.34	100%	100%	14 PREZAS	100%	OBRA COMPLETA




PUE2303022642785	239095	2023009	CONSTRUCCIÓN DE 8 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE NUEVO LIMONAR - 239095	LIMONAR	\$43,754.48	\$43,754.48	\$43,754.48	\$43,754.48	\$43,754.48	100%	100%	\$43,754.48	8 PIEZAS	OBRA COMPLETA
PUE230302264123	244749	2023012	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALZADA DEL PANTON DEL CADENAMIENTO 000 AL 319, EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, DEL MUNICIPIO PANTEPEC, PUEBLA - 244749	MECAPALAPA	\$2,112,432.82	\$2,112,432.82	\$2,112,432.82	\$2,112,432.82	\$2,112,432.82	100%	100%	\$2,112,432.82	193055 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETA
PUE230302264151	244858	2023013	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EL POZO A SAN GREGORIO, DEL CADENAMIENTO 000 AL 1860, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUE. - 244858	EL POZO	\$788,739.89	\$788,739.89	\$788,739.89	\$788,739.89	\$788,739.89	100%	100%	\$788,739.89	1860 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETA
PUE230302264182	244941	2023015	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 5 DE MAYO, CALLE ESCONDIDA, CALLE 2 DE ABRIL, CALLE PAPATLILAR, CALLE BUENA VISTA, CALLE 3 DE MAYO, CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE LOS PINOS Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE EIDO CAÑADA COLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 244941	EIDO CAÑADA COLOTLA	\$573,638.27	\$573,638.27	\$573,638.27	\$573,638.27	\$573,638.27	100%	100%	\$573,638.27	844 METROS LINEALES	OBRA COMPLETA
PUE230302264206	245045	2023017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE COLONIA EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 245045	MECAPALAPA	\$2,254,864.69	\$2,254,864.69	\$2,254,864.69	\$2,254,864.69	\$2,254,864.69	100%	100%	\$2,254,864.69	1847 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETA
PUE230302264213	245072	2023018	REHABILITACION DE TRES AJULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO EDUARDO TRISGUERRAS C.C.T. 21ETV0044E, DE LA LOCALIDAD DE TEJERIA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 245072	TEJERIA	\$475,413.72	\$475,413.72	\$475,413.72	\$475,413.72	\$475,413.72	100%	100%	\$475,413.72	3 AJULAS	OBRA COMPLETA
PUE230302264228	245116	2023019	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CAMINO DE EIDO CAÑADA COLOTLA A BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 245116	EIDO CAÑADA COLOTLA	\$1,115,787.86	\$1,115,787.86	\$1,115,787.86	\$1,115,787.86	\$1,115,787.86	100%	100%	\$1,115,787.86	2 PUENTES	OBRA COMPLETA
PUE230302264240	245148	2023020	CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL MECAPALAPA C.C.T. 21EBH0214Z, EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 245148	MECAPALAPA	\$885,767.31	\$885,767.31	\$885,767.31	\$885,767.31	\$885,767.31	100%	100%	\$885,767.31	585 METROS CUADRADOS	OBRA COMPLETA
PUE230302264254	245194	2023021	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO AMELUCA A EL CARRON LA LANADA, EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 245194	AMELUCA	\$8,395,379.04	\$8,395,379.04	\$8,395,379.04	\$8,395,379.04	\$8,395,379.04	54%	54%	\$4,508,623.81	54 PUENTES	LA OBRA TOTAL CONSTARA DE UN 1 PUENTE

Gobierno de Puebla  
SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
Asistente

9 NOV 2023

RECIBIDO  
FM2/SR/CGPSE


FORTALECIMIENTO DE												
ROLULO SISTEMA SISEP	No. MIRE	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	REGISTRADO	COMPROMETIDO	PAGADO	ERECIDO	PAGADO	AVANCE (%)	OBSERVACIONES
PUE230202236068	N/A	2023030	CONSTRUCCION DE MODULO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC	\$795,702.43	\$795,702.43	\$795,702.43	\$795,702.43	\$795,702.43	\$795,702.43	\$795,702.43	100%	OBRA COMPLETA
TMP_PUE230302272171	N/A	2023036	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC	\$677,236.90	\$677,236.90	\$677,236.90	\$677,236.90	\$677,236.90	\$677,236.90	\$677,236.90	100%	OBRA COMPLETA
TMP_PUE230302272176	N/A	2023042	MANUTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	\$73,660.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$73,660.00	100%	OBRA COMPLETA
TMP_PUE230302272180	N/A	2023044	INSTALACION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	100%	OBRA COMPLETA

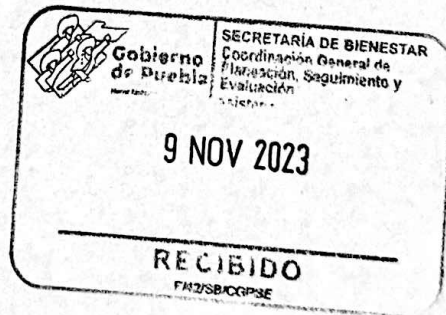





Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
111	1	2023	2	33	1	4	FAISMUN	1	38556.27	0												INTERESES SE UTILIZARAN EN LA PARTIDA 614
	2										2	612	1965764.32	6398651.96	6398651.96	1965764.32	1965764.32	1965764.32	1965764.32	1965764.32		EDIFICACION NO HABITACIONAL; TECHADOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN: REHABILITACIÓN DE OBRAS ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTO HIDRÁULICO, Y SE UTILIZARAN
	2										2	614	44372400.35	334092229.97	23228829.37	1878642318	14901721.95	14901721.95	14901721.95	14901721.95		INTERESES VIVIENDA: TECHO FIRME, ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANEL POR VIVIENDA
	2										1	441	4563838.33	11132677.34	11132677.34	1800000	6667250.58	6667250.58	6667250.58	6667250.58		INTERESES SE UTILIZARAN EN LA PARTIDA 614 PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
111	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN	1	10517.91	0												
	2										1	113	1800000	1800000	1800000	1800000	445417.8	445417.8	445417.8	445417.8		
	2										1	249	0	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000		


**Gobierno de Pinar del Rio**  
 SECRETARIA DE BIENES  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento  
 Evaluación  
 Asistente  
 9 NOV 2023  
 RECIBIDO  
 1800000



Ciclo Periodo	Trimestre	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Programa Funcional	Función	Subsección	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Méa programada	Méa reportada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Plazo
2023	3	Puebla	Pantepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Desarrollo Comunitario Social	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2,94118	2,94118	0	Otros causas	META ALCANZADA AUN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"	N/D	Validado
2023	3	Puebla	Pantepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Desarrollo Comunitario Social	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS al trimestre directa	(Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	67,64706	67,64706	88,09524	Otros causas	VARIACIÓN A LA ALTA DEBIDO A CAMBIOS EN EL CATALOGO 2023 DE LOS LINEAMIENTOS	130,23	Validado
2023	3	Puebla	Pantepec	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Desarrollo Comunitario Social	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	29,41176	29,41176	11,90076	Otros causas	VARIACION A LA ALTA DEBIDO A CAMBIOS DE INCIDENCIA EN EL CATALOGO 2023 DE LOS LINEAMIENTOS	242,06	Validado





Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Proyecto	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Mesa programática	Mesa Modificada	Resultado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
-------	---------	-----------	--------------------	-----------	------	--------	-------------------------	---------------------	-----------------	---------	------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-------------------	-----------------	-------------------------	---------------	---------	------------	-------

2023	3	3	Puebla	Perotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN Social	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	183721 Recursos	Eficacia	(Gasto ejercido del Fortamun por el municipio o demarcación territorial) / Monto anual aprobado del Fortamun en el ejercicio de demarcación territorial * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acordante	66.66667	66.66667	51.59081	Otros causas	EL AVANCE ES MENOR AL DEBIDO A QUE HAY PROYECTOS EN VALIDACIÓN	73.39	Validado
2023	3	3	Puebla	Perotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN Social	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549 Recursos	Eficacia	Porcentaje (Recursos transferidos del Fortamun recibidos por municipios y demarcación territorial de la Ciudad de México) / Monto anual aprobado del Fortamun en el municipio o demarcación territorial * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acordante	66.66667	66.66667	66.66667	Otros causas	RECURSO EN VALIDACIÓN	100	Validado



CDUO	TITULO	FECHA	MONTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID	MUNICIPIO	TIPO	ECUATORIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	ESTATUS	RUJDO
2023	3 PUEB2002228971		100955	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 100955.0, modificado: 100955.0	CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCHA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LUJO CAÑAMA CACULTA - 118595	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	21-01-2023	12-03-2023	100955	100955	75716.25	75716.25	75716.25	En Ejecución	Validado avances
2023	3 PUEB2002230030		146384.75	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 146384.75, modificado: 146384.75	CONSTRUCCION DE 20 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCHA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL POZO - 118718	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	22-01-2023	12-03-2023	146384.75	146384.75	56477.43	56477.43	56477.43	En Ejecución	Validado avances
2023	3 PUEB2002230046		843247	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 843247.0, modificado: 843247.0	CONSTRUCCION DE 60 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCHA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AMELUCA - 118792	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	22-01-2023	12-03-2023	843247	843247	50477.43	50477.43	50477.43	En Ejecución	Validado avances
2023	3 PUEB2002230066		161528	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 161528.0, modificado: 161528.0	CONSTRUCCION DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCHA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 118776	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	22-01-2023	12-03-2023	161528	161528	70668.43	70668.43	70668.43	En Ejecución	Validado avances
2023	3 PUEB2002230074		83952379.04	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 83952379.04, modificado: 83952379.04	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO AMELUCA A EL TADON LA PLANADA, EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA DEL MUNICIPIO DE PARTATEPEC PUEBLA - 245154	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	28-08-2023	05-12-2023	83952379.04	83952379.04	4508623.81	4508623.81	4508623.81	En Ejecución	Validado avances
2023	3 PUEB2002230084		65631.72	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 65631.72, modificado: 65631.72	ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCHA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE GUADALUPE - 237081	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	05-03-2023	18-04-2023	65631.72	65631.72	65631.72	65631.72	65631.72	Terminado	Validado avances
2023	3 PUEB2002230085		49233.79	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 49233.79, modificado: 49233.79	CONSTRUCCION DE 8 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCHA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL COTO - 238141	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	05-03-2023	18-04-2023	49233.79	49233.79	49233.79	49233.79	49233.79	Terminado	Validado avances
2023	3 PUEB2002230085		43754.48	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 43754.48, modificado: 43754.48	ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCHA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE NUEVO LIMONAR - 238985	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	05-03-2023	18-04-2023	43754.48	43754.48	43754.48	43754.48	43754.48	Terminado	Validado avances
2023	3 PUEB2002230182		573638.27	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 573638.27, modificado: 573638.27	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DE MAYO, CALLE ESCONDIDA, CALLE 2 DE ABRIL, CALLE PAPATZIL, CALLE BUENA VISTA, CALLE 3 DE MAYO, CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE LOS PINOS Y CALLE PINO SUREZ EN LA LOCALIDAD DE EBRO CAJAMUA DE LA LOCALIDAD DE PARTATEPEC PUEBLA - 244961	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	17-03-2023	10-04-2023	573638.27	573638.27	573638.27	573638.27	573638.27	Terminado	Validado avances
2023	3 PUEB2002230213		475413.72	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 475413.72, modificado: 475413.72	REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELECOMUNICACIONES EDUCACION PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CARENCHA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE PARTATEPEC PUEBLA - 245072	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	10-02-2023	10-04-2023	475413.72	475413.72	475413.72	475413.72	475413.72	Terminado	Validado avances
2023	3 PUEB2002230252		76570.34	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 76570.34, modificado: 76570.34	CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCHA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 245190	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	05-03-2023	18-04-2023	76570.34	76570.34	76570.34	76570.34	76570.34	Terminado	Validado avances
2023	3 PUEB2002230428		1115787.86	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 1115787.86, modificado: 1115787.86	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO PATRONAL, EN CALLES EN EL CAMBIO DE EBRO CAJAMUA, COLONIA LA BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN LEON PUEBLA - 245136	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	11-02-2023	11-04-2023	1115787.86	1115787.86	1115787.86	1115787.86	1115787.86	Terminado	Validado avances
2023	3 PUEB2002230606		795702.43	FF1: I&S, recurso 2023, items 33, modalidad: prog_jpres_4, tipo: recursosPERMANENTES IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 795702.43, modificado: 795702.43	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE GOLF EN LOCALIDAD DE LA CARRERA MUNICIPAL DE PARTATEPEC PUEBLA	21	Puebla	111	Particip	Municipio de Partatepec	12-05-2023	08-08-2023	795702.43	795702.43	795702.43	795702.43	795702.43	Terminado	Validado avances



CDLO TRIM.	FOUD	MONTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO TIPO	ELEGIOMIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECARGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	ESTATUS	FLUID
2023	3	PVE2300226465	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:54693.1, modificado:54693.1}	CONSTRUCCIÓN DE 10 TANQUES DE CONCRETO PARA LA ATENCION DE LA CARGENA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE BARRIO CHICO - 237733	21 Puebla	311 Pantepec	Municipio de Pantepec	06-03-2023	18-04-2023	54693.1	54693.1	54693.1	54693.1	54693.1 Terminado	Validado avances
2023	3	PVE2300226423	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:212483.82, modificado:212483.82}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE DE LA ATENCION DE CARNAMAMENTO OZA A 318 EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, DEL MUNICIPIO PANTEPPEC, PUEBLA - 244796	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	24-01-2023	24-04-2023	212483.82	212483.82	212483.82	212483.82	212483.82 Terminado	Validado avances
2023	3	PVE2300226426	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2254864.69, modificado:2254864.69}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALICO EN CALLES DE COLONIA EL MINIMOR EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, DEL MUNICIPIO DE PANTEPPEC, PUEBLA - 265685	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	15-03-2023	17-06-2023	2254864.69	2254864.69	2254864.69	2254864.69	2254864.69 Terminado	Validado avances
2023	3	PVE2300226296	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:76570.34, modificado:76570.34}	CONSTRUCCION DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARGENA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL LIMONAR - 396304	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	06-03-2023	18-04-2023	76570.34	76570.34	76570.34	76570.34	76570.34 Terminado	Validado avances
2023	3	PVE2300226293	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:60162.41, modificado:60162.41}	CONSTRUCCION DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARGENA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AGUA LIMAR - 395112	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	05-03-2023	18-04-2023	60162.41	60162.41	60162.41	60162.41	60162.41 Terminado	Validado avances
2023	3	PVE2300227230	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_5, tipo_recurso:CONVENIOS, monto:330000, modificado:330000.0}	INSTALACION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PANTEPPEC	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	07-07-2023	05-08-2023	330000	330000	330000	330000	330000 Terminado	Validado / Registrado avances
2023	3	PVE2300226451	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:788739.89, modificado:788739.89}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EL CERRILLO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRILLO AL 1860 EN LA LOCALIDAD DE EL CERRILLO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUE - 244858	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	27-01-2023	07-03-2023	788739.89	788739.89	788739.89	788739.89	788739.89 Terminado	Validado avances
2023	3	PVE2300226440	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:885767.31, modificado:885767.31}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALICO PARA EL TRAMO EN EL BARRIO GENERAL OTICAL MECAPALAPA C.C.T. 218890242, EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA - 245148	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	11-03-2023	11-04-2023	885767.31	885767.31	885767.31	885767.31	885767.31 Terminado	Validado avances
2023	3	PVE2300227217	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_5, tipo_recurso:CONVENIOS, monto:677236.9, modificado:677236.9}	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CATEGORIA MUNICIPAL DE PANTEPPEC	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	09-05-2023	07-07-2023	677236.9	677236.9	677236.9	677236.9	677236.9 Terminado	Validado / Registrado avances
2023	3	PVE2300226288	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:27346.55, modificado:27346.55}	CONSTRUCCION DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARGENA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CERRILLO - 439397	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	05-03-2023	18-04-2023	27346.55	27346.55	27346.55	27346.55	27346.55 Terminado	Validado avances
2023	3	PVE23002262173	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:639909.12, modificado:639909.12}	CONSTRUCCION DE 107 TANQUES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARGENA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE PANTEPPEC - 236555	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	05-03-2023	18-04-2023	639909.12	639909.12	639909.12	639909.12	639909.12 Terminado	Validado avances
2023	3	PVE2300227216	R1: {cde_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pms_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:73660, modificado:73660.0}	MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA	21 Puebla	111 Pantepec	Municipio de Pantepec	07-08-2023	21-08-2023	73660	73660	73660	73660	73660 Terminado	Validado / Registrado avances





Entidad	Municipio	Programa	Clave	Programa Convencional Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Resumido (Iniciado)	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Programa presupuestario 2023 CONVENIOS FEDERALES	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	38556.27	Total del Programa Presupuestario	50902003	50940559.27	40760158.67	27936267.29	23534736.85	23534736.85	23534736.85	40721602.4	Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Pantepec", "Observación": "INTERESES SE UTILIZARAN EN LA PARTIDA 614*"]
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004	FAISMUN	Municipio de Pantepec		1 - Gasto corriente personas	441 - Ayudas a corrientes personas	4563838.33	11133677.34	11133677.34	6667250.58	6667250.58	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION: REHABILITACION DE OBRAS ALICANTARILLADO PARA POTABLE ELECTRIFICACION DE LINEAS DE TRANSMISION, Y SE UTILIZARAN INTERESES
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004	FAISMUN	Municipio de Pantepec		2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de inversión urbanización	44372400.35	33402925.97	23228929.37	18788477.18	14901721.95	14901721.95	N/A	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL: TECHADOS
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004	FAISMUN	Municipio de Pantepec		2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	1985764.32	6398651.96	6398651.96	1985764.32	1985764.32	N/A	N/A	Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Pantepec", "Observación": "INTERESES SE UTILIZARAN EN LA PARTIDA 614*"]
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	10517.91	Total del Programa Presupuestario	16448083	16486600.91	10975906.55	12641339.91	8485666.97	8485666.97	8485666.97	10965388.64	Validado	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1005	FORTAMUN	Municipio de Pantepec		1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal	0	420000	420000	420000	420000	420000	N/A	Validado	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1005	FORTAMUN	Municipio de Pantepec		1 - Gasto corriente	1800000	1800000	1800000	1800000	445417.8	445417.8	445417.8	N/A	Validado	CONVENIO DE APORTACION AL CERESO
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1005	FORTAMUN	Municipio de Pantepec		1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	822404.15	822404.15	822404.15	822404.15	822404.15	N/A	N/A	Validado	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1005	FORTAMUN	Municipio de Pantepec		1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	0	73660	73660	73660	73660	73660	N/A	Validado	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DIGNOS EN VIVIENDAS
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1005	FORTAMUN	Municipio de Pantepec		1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a corrientes personas	0	1100000	1100000	350000	350000	350000	N/A	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN SALONES DE USOS MULTIPLES;
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1005	FORTAMUN	Municipio de Pantepec		2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	1943813.86	330618.05	330618.05	330618.05	330618.05	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION: REHABILITACION DE OBRAS ALICANTARILLADO PARA POTABLE ELECTRIFICACION DE LINEAS DE TRANSMISION, Y SE UTILIZARAN INTERESES
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1005	FORTAMUN	Municipio de Pantepec		2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de inversión urbanización	8281864.99	5253816.71	1447073.62	1436555.71	1436555.71	1436555.71	N/A	Validado	EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1005	FORTAMUN	Municipio de Pantepec		1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0	88102	88102	88102	88102	88102	N/A	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	Pantepec	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1005	FORTAMUN	Municipio de Pantepec		1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3600000	3600000	1934048.73	3600000	1548909.26	1548909.26	N/A	Validado	

